

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO AL TURISMO, COMMERCIO E ARTIGIANATO

P.O. FESR 2007 - 2013


Asse V - Sviluppo Urbano - Linea d'attività 5.2.2.b
*Iniziative volte alla valorizzazione delle specificità territoriali,
anche sostenute da interventi infrastrutturali,
legate alle identità culturali e produttive locali in una logica di sviluppo durevole*

COMUNE DI FONNI

progetto di:
le botteghe degli antichi
mestieri nella cultura
pastorale fonnese

PROGETTO ESECUTIVO

RETE DI COOPERAZIONE

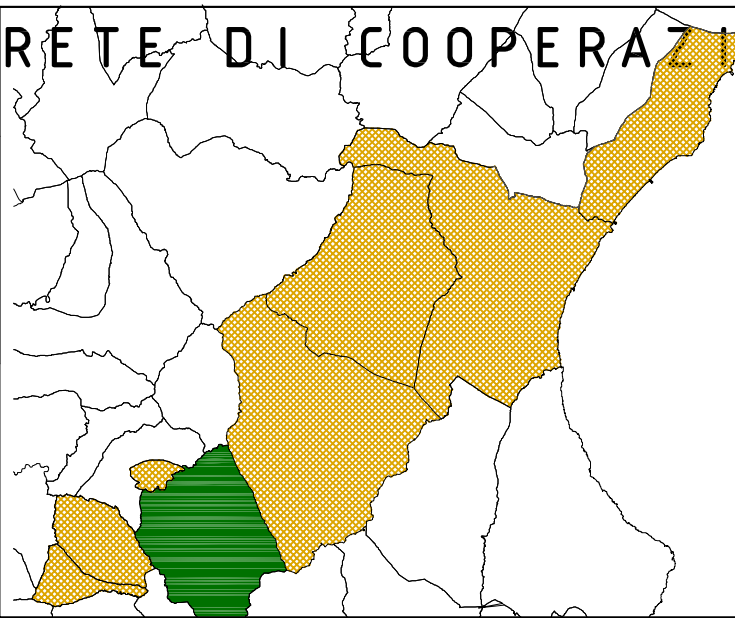

T - O T T ' 1

Dorgali

Fonni

Lodine

Oliena

Orgosolo

Orosei

Ovodda

Tiana

ALLEGATO

ELABORATO:

I

CRONOPROGRAMMA - DIAGRAMMA DI GANTT

Data: Marzo 2013

Il R. U. P.: Geom. Mario Demartis

Il Tecnico incaricato: Ing. Valter Secci

I Collaboratori: Arch. Noemi Casula

Ing. Giorgio Curreli




TABELLA ANALITICA GANTT


Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C	data Iniziale	data Finale
Allestimento del cantiere						
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1	E	2	2	10/06/2013	11/06/2013
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	1	E	2	2	10/06/2013	11/06/2013
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	1	E	1	1	10/06/2013	10/06/2013
Allestimento di servizi sanitari del cantiere	1	E	1	1	10/06/2013	10/06/2013
Realizzazione di impianto idrico del cantiere	1	E	1	1	10/06/2013	10/06/2013
Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere	1	E	1	1	10/06/2013	10/06/2013
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1	E	1	1	10/06/2013	10/06/2013
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	1	E	1	1	10/06/2013	10/06/2013
Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso	1	E	6	8	10/06/2013	17/06/2013
	1	E	5	7	20/06/2013	26/06/2013
	1	E	5	7	29/08/2013	04/09/2013
Rimozione di finiture e impianti						
Pulizia dell'area di cantiere	1	E	5	5	10/06/2013	14/06/2013
Rimozione di serramenti esterni	1	E	7	9	17/06/2013	25/06/2013
Rimozione di serramenti interni e di scale in legno	1	E	7	9	17/06/2013	25/06/2013
Rimozione di solai in legno	1	E	10	12	08/07/2013	19/07/2013
Rimozione di massetto di calce	1	E	5	7	11/06/2013	17/06/2013
Rimozione di pavimenti interni	1	E	5	7	14/06/2013	20/06/2013
Smontaggio di pareti divisorie	1	E	5	7	11/06/2013	17/06/2013
Demolizione di c.a.	1	E	7	9	11/06/2013	19/06/2013
Demolizione generale di murature portanti eseguita a mano e con l'impiego di mezzi meccanici	1	E	10	14	11/06/2013	24/06/2013
Smontaggio di tetto a falde con orditura in legno	1	E	5	5	01/07/2013	05/07/2013
Rimozione di manto di copertura in tegole	1	E	5	5	24/06/2013	28/06/2013
Rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni	1	E	7	9	17/06/2013	25/06/2013
Rimozione di intonaci e rivestimenti esterni	1	E	5	5	08/07/2013	12/07/2013
Rimozione di ringhiere e parapetti	1	E	1	1	25/06/2013	25/06/2013
Ricostruzione solai e tetti						
Realizzazione di murature esterne	1	E	6	8	22/07/2013	29/07/2013

Posa di piastre di ancoraggio per tiranti	1	E	2	2	22/07/2013	23/07/2013
Posa di tiranti orizzontali in acciaio	1	E	2	2	24/07/2013	25/07/2013
Realizzazione della carpenteria di armatura di solaio in legno	1	E	11	15	24/07/2013	07/08/2013
Posa di tetto in legno	1	E	11	16	07/08/2013	22/08/2013
Posa delle tegole	1	E	7	9	22/08/2013	30/08/2013
posa di solaio in legno	1	E	14	20	29/08/2013	17/09/2013
Formazione di massetto per pavimenti interni	1	E	9	11	17/09/2013	27/09/2013
Impermeabilizzazione solaio in cls	1	E	4	4	30/09/2013	03/10/2013
Posa di pavimento	1	E	13	17	14/10/2013	30/10/2013
Realizzazione delle opere d'arte e sottoservizi						
Realizzazione della carpenteria per opere d'arte in lavori stradali	1	E	5	5	14/10/2013	18/10/2013
Lavorazione e posa ferri di armatura per opere d'arte in lavori stradali	1	E	6	8	14/10/2013	21/10/2013
Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali	1	E	8	10	21/10/2013	30/10/2013
Cordoli, zanelle e opere d'arte	1	E	8	12	10/10/2013	21/10/2013
Realizzazione della strada						
Scavo di sbancamento	1	E	7	9	01/10/2013	09/10/2013
Formazione del massetto di fondazione stradale	1	E	10	15	28/10/2013	11/11/2013
posa del selciato	1	E	14	20	14/11/2013	03/12/2013
Segnaletica orizzontale e verticale						
Posa di segnali stradali	1	E	4	4	03/12/2013	06/12/2013
Realizzazione di segnaletica orizzontale	1	E	4	4	03/12/2013	06/12/2013
Smobilizzo del cantiere	1	E	4	4	09/12/2013	12/12/2013
<p>LEGENDA:</p> <p>Z = ZONA</p> <p>Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:</p> <p>1) = ZONA UNICA</p> <p>I = IMPRESA</p> <p>Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:</p> <p>E <Nessuna impresa definita></p>						


gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

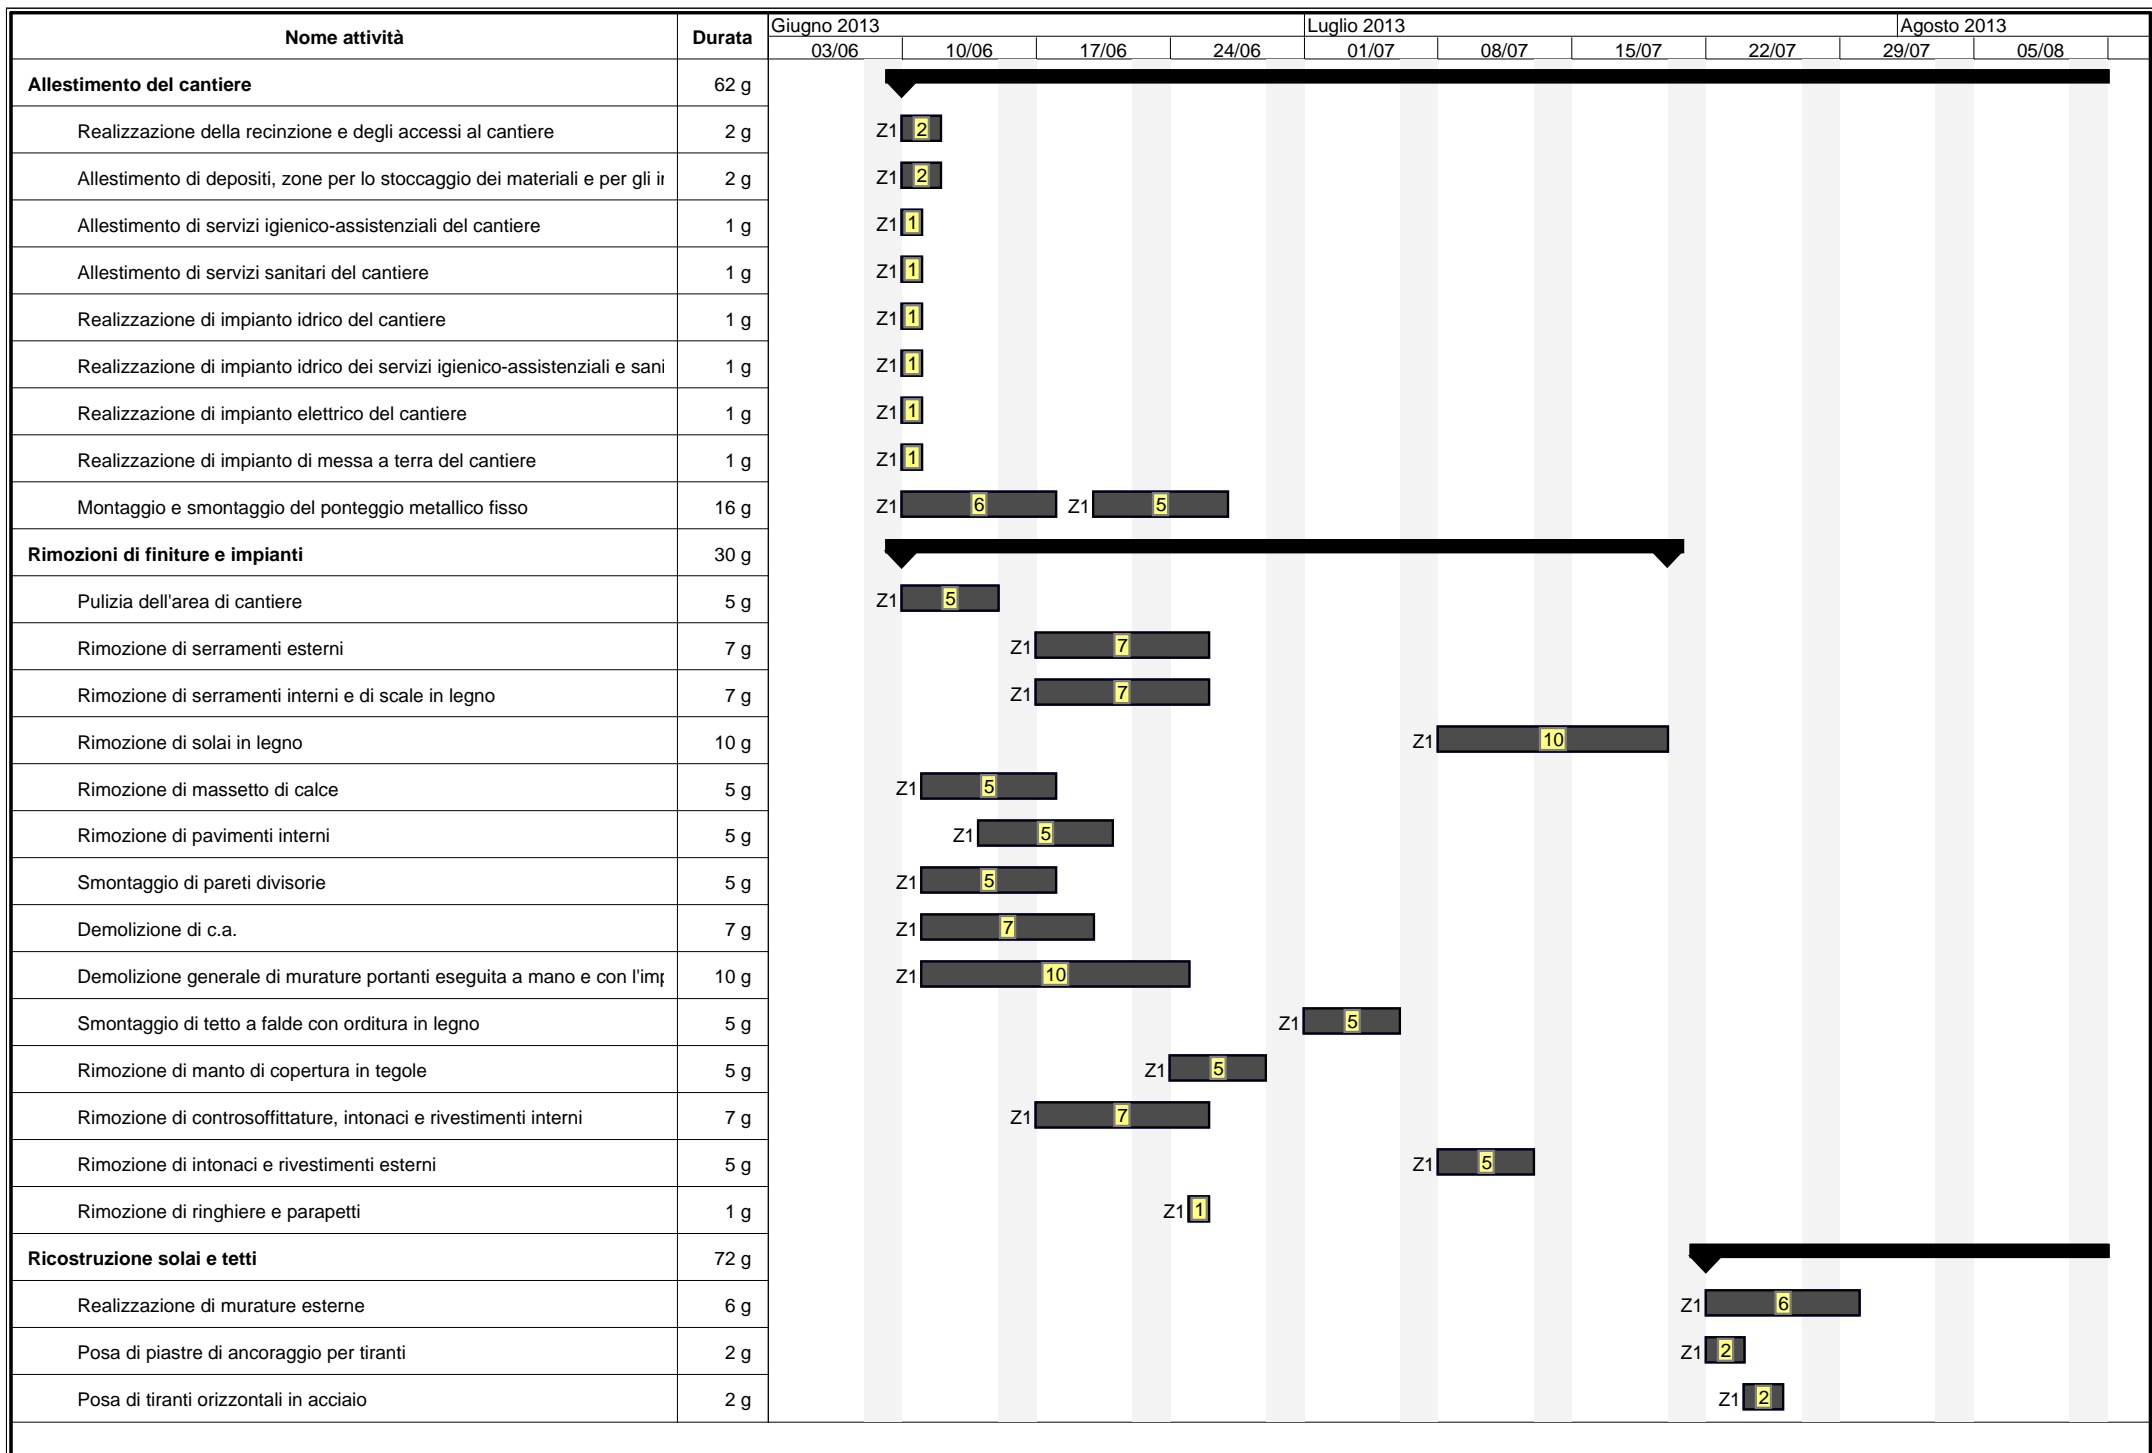

Nome attività	Durata	Giugno 2013				Luglio 2013				Agosto 2013			
		03/06	10/06	17/06	24/06	01/07	08/07	15/07	22/07	29/07	05/08		
Realizzazione della carpenteria di armatura di solaio in legno	11 g								Z1	11			
Posa di tetto in legno	11 g											Z1	11
Posa delle tegole	7 g												
posa di solaio in legno	14 g												
Formazione di massetto per pavimenti interni	9 g												
Impermeabilizzazione solaio in cls	4 g												
Posa di pavimento	13 g												
Realizzazione delle opere d'arte e sottoservizi	15 g												
Realizzazione della carpenteria per opere d'arte in lavori stradali	5 g												
Lavorazione e posa ferri di armatura per opere d'arte in lavori stradali	6 g												
Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali	8 g												
Cordoli, zanelle e opere d'arte	8 g												
Realizzazione della strada	45 g												
Scavo di sbancamento	7 g												
Formazione del massetto di fondazione stradale	10 g												
posa del selciato	14 g												
Segnaletica orizzontale e verticale	4 g												
Posa di segnali stradali	4 g												
Realizzazione di segnaletica orizzontale	4 g												
Smobilizzo del cantiere	4 g												
LEGENDA Zona:													
Z1 = ZONA UNICA													

Settembre 2013				Ottobre 2013				Novembre 2013								
12/08	19/08	26/08	02/09	09/09	16/09	23/09	30/09	07/10	14/10	21/10	28/10	04/11	11/11	18/11		
<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>																
			<div><div>Z1</div><div>5</div></div>													
<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>																

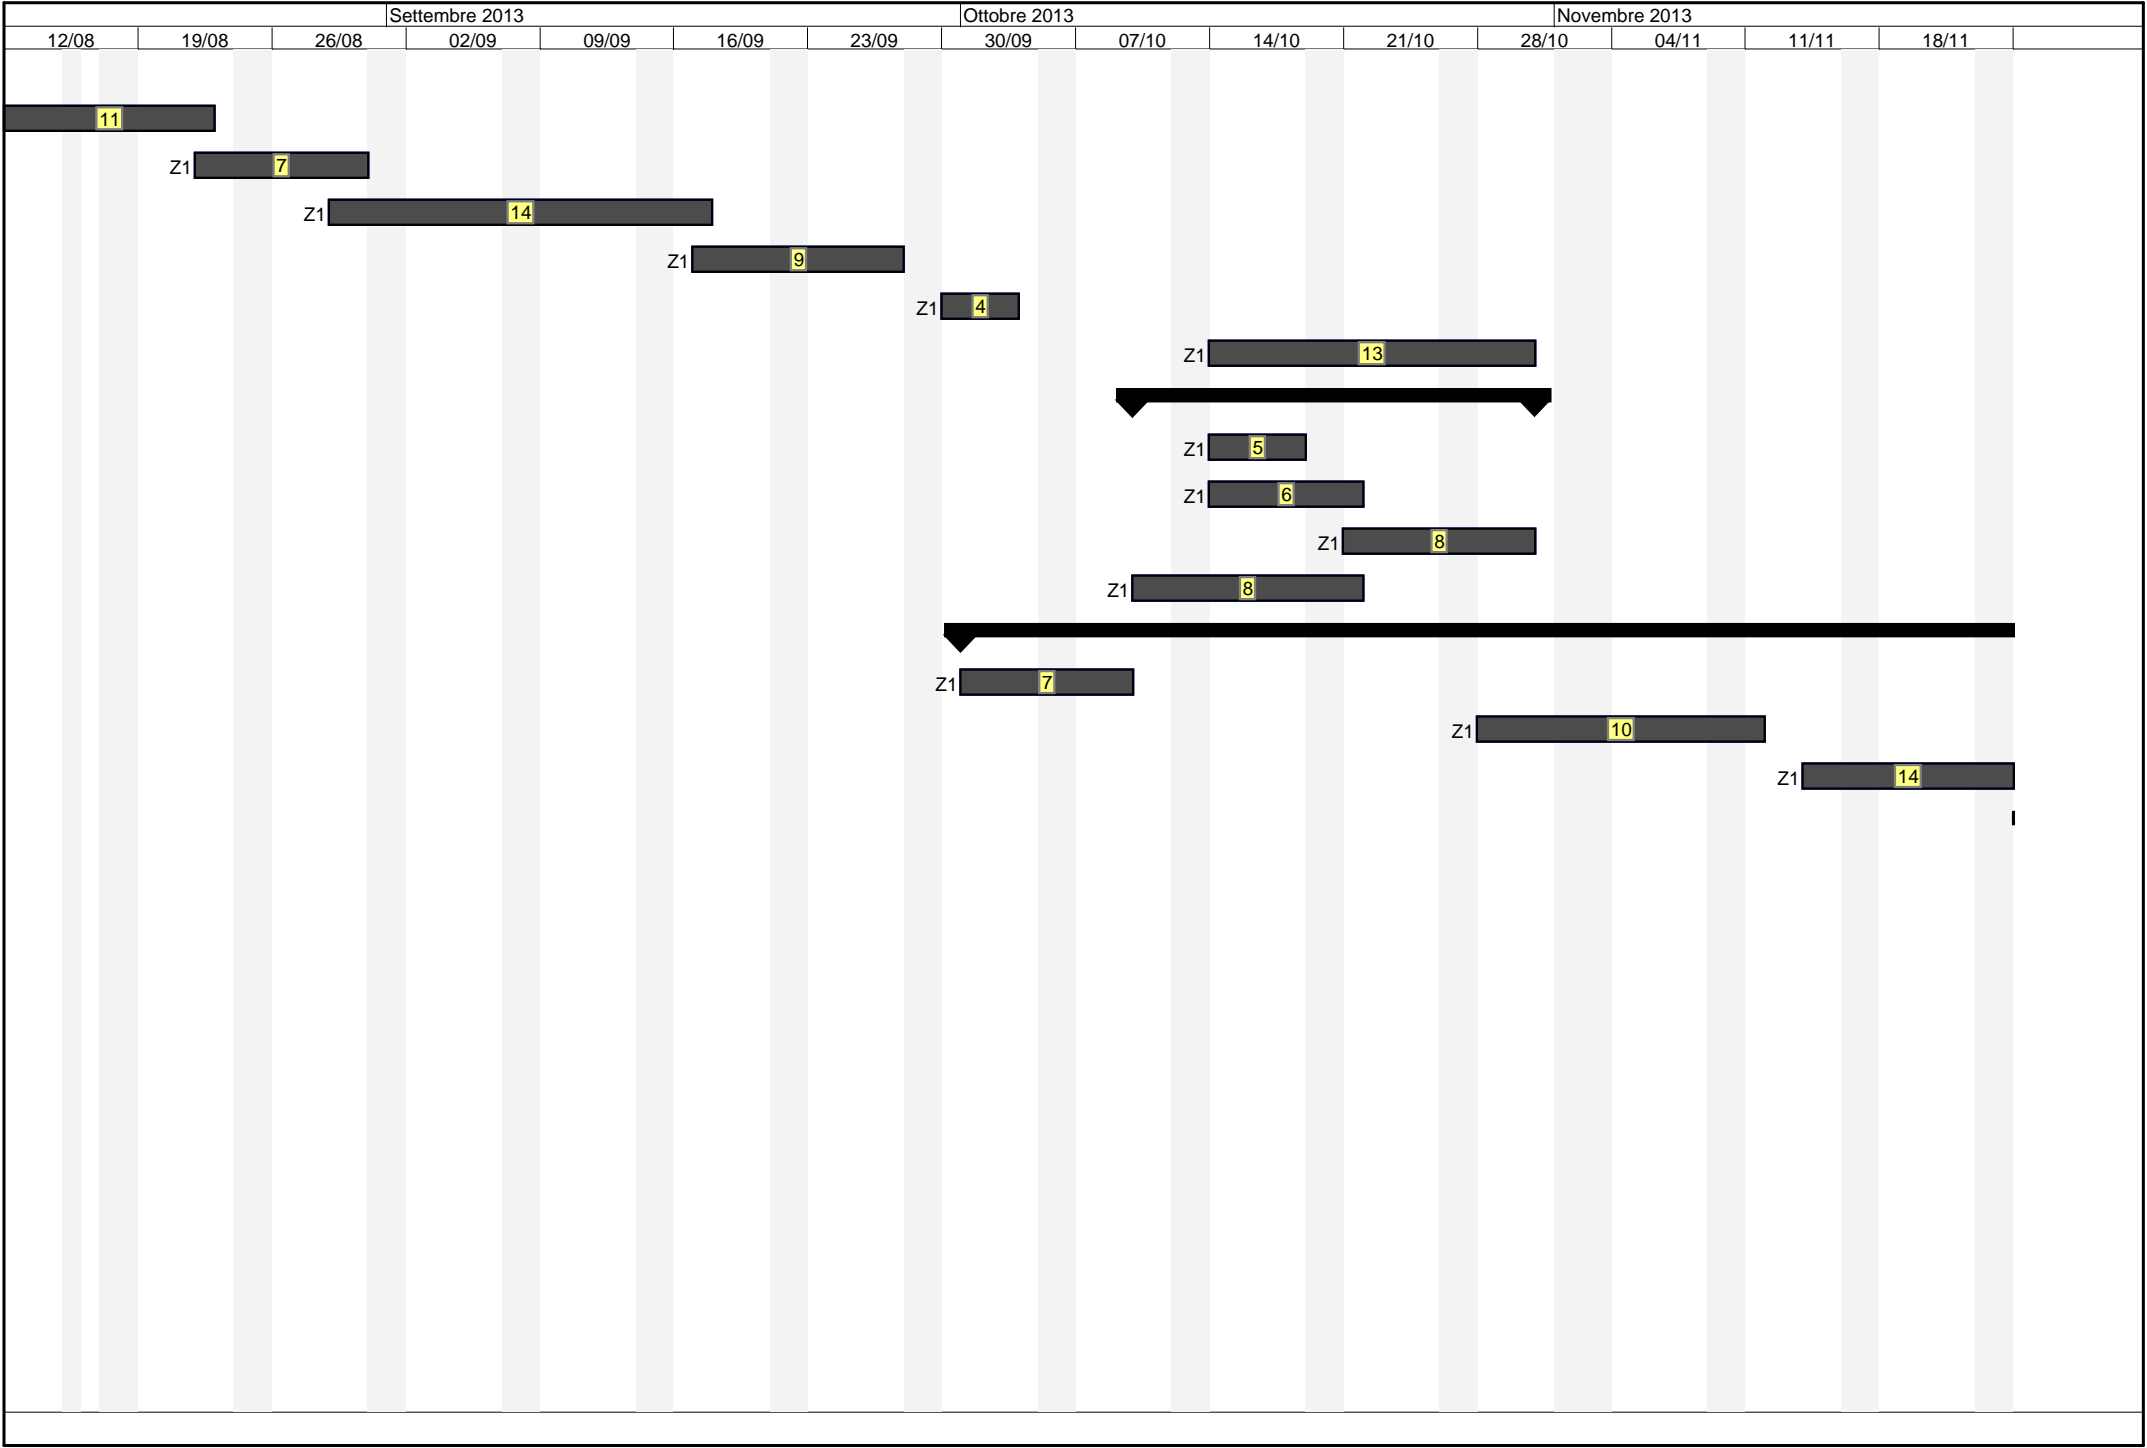

		Dicembre 2013					Gennaio 2014					Febbraio 2014					Marzo 2014														
25/11		02/12		09/12		16/12		23/12		30/12		06/01		13/01		20/01		27/01		03/02		10/02		17/02		24/02		03/03			

Dicembre 2013				Gennaio 2014				Febbraio 2014				Marzo 2014			
25/11	02/12	09/12	16/12	23/12	30/12	06/01	13/01	20/01	27/01	03/02	10/02	17/02	24/02	03/03	
<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>															
